

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

EVENTO:	REUNION ☐	MESA DE TRABAJO ☐	CAPACITACIÓN ☐	OTRO ☒
---------	----------------------------------	--	---------------------------------------	--

FECHA: 2023-08-02	HORA INICIO: 9:00 am	HORA FINAL: 12:30 pm	REUNIÓN N°: 06-2023
LUGAR: Hospital El Tunal – Área de obras: Centro de Salud y Reorganización Urgencias			
TEMA: Recorrido de obras y seguimiento avance de obras – Veeduría Obras Tunal			
RESPONSABLE: Ingeniero Carlos Tovar e Ingeniero Mateo Aristizabal		SECRETARIO: Notas por Ana Milena Bayona Gómez	

1. OBJETIVO:
Realizar asistencia técnica de recorrido a las obras en el marco de la veeduría al Convenio 2806257 de 2021 Fondo Financiero Distrital y Subred Sur: Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal y el Convenio 1223 2017 Fondo Financiero Distrital y Subred Sur: Adecuación y Dotación Centro de Salud El Tunal

2. PARTICIPANTES:					
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 “Lista de asistencia institucional”					
NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA	
1 Concepción Castañeda	Veedora	con.cabe@hotmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial	
2 Rosalba Gutiérrez	Veedora	asodeuhvh3@gmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial	
3 Nelly Saldarriaga	Veedora	nellya@hotmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial	
4 Edgar Loaiza	Veedor	libraescorpion1941@gmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial	
5 Darío Baquero Martínez	Veedor	asouhtunal@hotmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial	
6 Consuelo Lora Niño	Veedora	asouhtunal@hotmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial	
7 Carmen Peña	Veedora	asodeuhvh3@gmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial	
8 Rudencindo Celis	Representante Asociaciones	rubencel@hotmail.com	Junta Directiva Subred Sur	Presencial	
9 María Elena Ayala	Asociada	asouhtunal@hotmail.com	Asociación Usuarios El Tunal	Presencial	
10 Doris Janeth Vargas	Veedora	con.cabe@hotmail.com	Asociación Usuarios El Tunal	Presencial	
11 Carlos Tovar	Ingeniero	SD	Subred Sur – Gestión de proyectos	Presencial	
12 Mateo Aristizabal	Ingeniero	SD	Subred Sur – Gestión de proyectos	Presencial	
13 Andrés Hernández	Ingeniero SST	SD	Consorcio Tunal 2022	Presencial	
14 Wilson Cardoso	Ingeniero residente obra	SD	Consorcio Tunal 2022	Presencial	
15 Johann Sebastián González	Profesional Control Social	JSGonzalez@saludcapital.gov.co	Secretaría Distrital de Salud	Presencial	
16 Ana Milena Bayona Gómez	Profesional Universitario	participacion.tunjuelito@subreds.ur.gov.co	Of. Participación Comunitaria	Presencial	

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)
1. Bienvenida y registro de asistencia 2. Seguimiento compromisos 3. Presentación avances convenios El Tunal – recorrido a las obras Centro de Salud y Reorganización Urgencias 4. Acuerdos y compromisos Cierre de la reunión

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 2010-2011 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

Se verifica asistencia de ciudadanía veedoras e invitados de asociación Tunal, ingenieros de contratista de Reorganización Urgencias, ingenieros apoyo a la supervisión Gestión de Proyectos, profesional de control social de SDS y profesional de Participación de la Subred Sur.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

- Envío acta de reunión por correo electrónico, se realiza envío a correos registrados de acta el 30 de junio.
- Recorrido a la obra de centro de salud y reorganización urgencias Tunal. Se programa y realiza el recorrido el 02 agosto.
- Seguimiento al ajuste de los vidrios y sonido en área de ventanillas, instalación de puerta provisional de ingreso exclusiva para el Centro de Salud. Se realiza en recorrido.
- Seguimiento a recomendaciones

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. Bienvenida y registro de asistencia

Se realiza mesa de dialogo presencial en la sede de Hospital El Tunal, siguiendo las indicaciones de uso de tapabocas y desinfección de manos, además de uso de indumentaria para seguridad de los veedores en el área de obra, según las recomendaciones de seguridad (calzado cerrado, pantalón grueso, chaqueta). La Oficina de Participación de la Subred Sur, gestionó el vehículo institucional para el traslado de los veedores desde puntos Potosí, Manuela Beltrán y Venecia, desde las 9:00 am.

Se da inicio a la reunión para el seguimiento de avances con el recorrido de los Convenios 2806257 de 2020 y 1223 de 2017 SDS – Subred Sur, siendo la 10:10 am con 07 veedores.

La bienvenida y apertura de la reunión la realiza la profesional de participación para Tunjuelito Ana Milena Bayona Gómez, dando contexto de las obras de Tunal y explicando el objetivo de la reunión y presentando los profesionales que acompañaran para ofrecer la información.

3. **Presentación avances convenios de obras El Tunal**

Se recuerda a los asistentes que se tienen dos proyectos de obra en desarrollo en la sede de El Tunal, y se acuerda iniciar en el Centro de Salud y luego al área de urgencias.

Recorrido a la obra de Centro Salud Tunal

El ingeniero Mateo Aristizabal, saluda a los asistentes y agradece a los veedores la asistencia al recorrido por la obra del Centro de Salud El Tunal, informa que por motivos de seguridad los asistentes podrán ingresar al primero, segundo y cuarto piso del edificio, se realizan recomendaciones para tener precaución con pisos, paredes y materiales en el área, puesto que aun hay tubería y herramientas en el piso, se realiza revisión de la indumentaria de calzado, pantalón y chaqueta de los veedores y se especifica que al no estar adelantándose trabajos de la obra, se considera que no es necesario el uso de cascos.

El ingeniero informa a los asistentes que el contratista está en proceso de entrega de la obra y además están entregándose e instalándose la dotación de equipos biomédicos y mobiliario; explica que en el momento la fecha de inauguración propuesta es el 24 de agosto. Continúan los trabajos de cielos rasos del cuarto piso, lo mismo que instalaciones eléctricas y pintura.

En el edificio se evidencia instalacion y pruebas de ascensores hasta el quinto piso, se presentó a los veedores los consultorios y areas de salas de espera a los veedores del primer, segundo y cuarto piso, se

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALA L107 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

evidencia la instalacion de pasamanos y puesta en uso de las escaleras de usuarios. Se observa instalacion del piso en la totalidad del edificio, sin embargo los veedores le hacen recomendaciones en debido a que no esta parejo, se ven desniveles.

- Primer piso: area de sala de espera, area de rehabilitacion frio y calor y fuerza, farmacia, auditorio, sala de juntas, cuarto de residuos y bodega de elementos de aseo. Falta instalacion de vidrios en area de rehabilitacion, mobiliario de sala de espera, sala de juntas y auditorio.

- Segundo piso: area de sala de espera, consultorios con sus baños, area de procedimientos menores, caja de facturacion. Falta la instalacion de mobiliario.

- Tercer piso: no se realiza recorrido

- Cuarto piso: area de sala de espera, consultorios con sus baños, area de odontologia, espacio de bienestar y cafeteria. Se observa que se estan haciendo instalaciones electricas y actividades de pintura.

Los veedores realizan observaciones sobre:


- Los veedores reiteran sus dudas sobre la resistencia y calidad del piso de vinilo que se instaló, siendo visible en algunas áreas desniveles, por lo cual se solicita conocer tiempos de garantía y cuidado del piso.
- Los veedores reiteran la preocupación por las escaleras de emergencia queden protegidas, por seguridad de los bienes de la sede y también por posibles conductas de autoagresión de los ciudadanos, por lo cual solicitan enrejear especialmente el tercer y cuarto piso, además de conocer cuáles serían las medidas de seguridad para el tránsito de personas por estas escaleras.
- Se confirma la recepción de la administración frente a la solicitud de ajuste de vidrios con huecos para mejorar comunicación en ventanillas y la instalación de puerta provisional para ingreso exclusivo de los usuarios ambulatorios.
- Se hace recomendación de tener medidas de seguridad o separación de los edificios de centro de salud, urgencias y hospitalización, el ingeniero Mateo informa que el espacio va a servir de parqueadero, que se tiene previsto señalización y se solicitara al área administrativa que el personal de seguridad este pendiente en el control para evitar la circulación entre estos edificios cuando no es necesario.
- Los veedores hacen observaciones sobre las válvulas de la tubería de red contra incendios, pues está a la mano del público y a una altura en la que podrían presentarse dificultades, por lo que proponen hacer marcaciones y protección.
- Los veedores realizan observación de las placas metálicas de separación de pisos baldosa y vinisol, pues se observan algunas sueltas.
- Se reitera observación en los daños que ya presentan las cubiertas de fachada, indicando que se tiene previsto cambio de la pieza por parte del proveedor.

2

Proyecto:
 Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal



Se realiza recorrido en el segundo frente de obra reorganización en la que se ubicaba antiguamente urgencias y consulta externa, siendo recibidos por el ingeniero residente de la obra del consorcio Tunal 2022, quien facilita para cada veedor y ciudadanía cascos, indicando que es de obligatorio uso, teniendo en cuenta el riesgo en la etapa de escavacion y pilotaje:

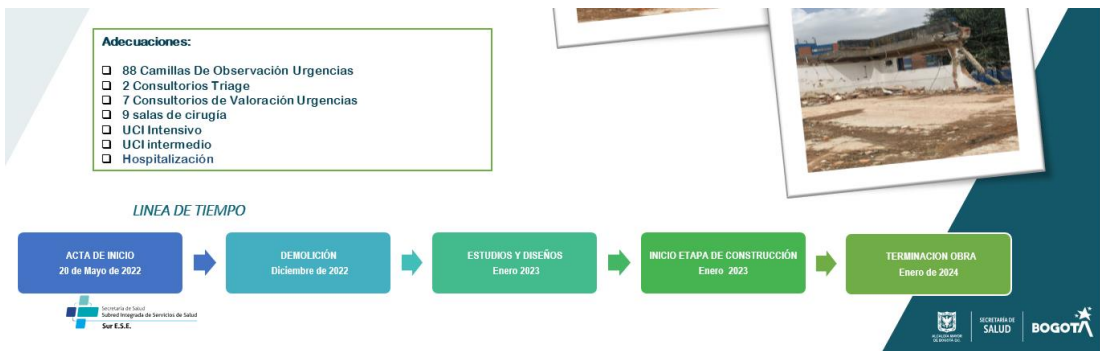

El arquitecto del consorcio informa que se tiene un avance de obra del 7 %, actualmente faltan por instalar cuatro pilotes de los 180 previstos, por lo cual se considera adelantada la etapa de cimentacion para reforzamiento de estructura. También el ingeniero manifiesta se encontró la estrategia para la circulación de aguas subterráneas lo que se esta controlando con los pozos de retención de esas aguas, buscando no tener afectaciones en las tareas de escavación, indicando que una vez se hagan las cimentaciones, se construirá teniendo en cuenta esas aguas dejándolas debajo de la estructura. Se muestra a los veedores la huella de la escavacion, dando una dimension de la estructura que se construirá un total de 12500 m2, que constituyen un sotano y cinco pisos en obra lleve en mano. Indica el ingeniero que se cuenta en el momento con maquinaria pesada de pilotaje y de escavación. Además se va a iniciar la construcción de solados para empezar la instalacion de zapatas y vigas, ademas que en el próximo mes se iniciara la construcción de los muros de contension para proteger el terreno

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALA L10 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

Reitera el ingeniero que están trabajando en el momento con 17 personas que realizan trabajo pesado y se indica que están contratadas 10 volquetas que están entrando y saliendo para recolección de escombros según indicaciones aprobadas en plan de manejo de tráfico.

Los veedores hacen diferentes preguntas e intervenciones con respecto a:

- Se tienen por parte de los veedores preocupación por cumplimiento del cronograma de la obra, preguntando si están previstas solicitudes de prórroga.
 - Se solicita información sobre profundidad de la obra y riesgos por afectación de las aguas subterráneas. El ingeniero indica que ya se hicieron las simulaciones y cálculos, estableciendo el plan de manejo para que no haya afectación o riesgo con la obra, indica que en promedio falta excavación de un piso más.
- Los ingenieros responden las inquietudes de los ciudadanos y se hace cierre de la actividad, con recorrido en el perímetro del área de la obra en zona segura.

Acuerdos y compromisos

- Enviar acta de recorrido a los correos electrónicos reportados, para soportar la mesa de diálogo.
- Se realizará mesa de trabajo una vez se inaugure el centro de salud, para hacer actualización de resolución de la veeduría y para construir informe final de veeduría en centro de salud, el cual se entregará a la administración de la subred Sur, la SDS, las asociaciones de usuarios de Tunal y Tunjuelito. Pendiente por definir la fecha.
- Se está pendiente de la información de la Alcaldía Mayor para la organización del evento de inauguración.
- Los veedores comparten las recomendaciones y compromisos registrados en sus formatos de seguimientos.

Veedores Tunal PS-PAR-FT-05 V2 LISTA ASISTENCIA REUNIÓN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD agosto 02 2023 (respuestas)

Marcas temporales	Dirección de correo electrónico	NOMBRE Y APELLIDO	NÚMERO DOCUMENTO (B/N PUNTO 8 Y SIN COMA)	NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD DE RESIDENCIA	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
2023-08-02	asovhermosa@gmail.com	ROSALBA GUTIERREZ	20263713	VEEDURIA ADECUACIÓN CAPS Y URGENCIAS EL TUNAL	CIUDAD BOLIVAR	312 5800058	PRESENCIAL
2023-08-02	naliya@hotmail.es	NELLY SILDARRIAGA	21551479	VEEDURIA ADECUACIÓN CAPS Y URGENCIAS EL TUNAL	CIUDAD BOLIVAR	3212979245	PRESENCIAL
2023-08-02	libraescorpion1941@gmail.com	EDGAR LOAIZA ALZATE	17052759	VEEDURIA ADECUACIÓN CAPS Y URGENCIAS EL TUNAL	TUNJUELITO	3138078184	PRESENCIAL
2023-08-02	con.cabe@hotmail.com	CONCEPCIÓN CASTAÑEDA BERMUDEZ	41722948	VEEDURIA ADECUACIÓN CAPS Y URGENCIAS EL TUNAL	TUNJUELITO	5639378	PRESENCIAL
2023-08-02	elirga78@hotmail.com	MARÍA DEL CARMEN PEÑA	41583245	VEEDURIA ADECUACIÓN CAPS Y URGENCIAS EL TUNAL	CIUDAD BOLIVAR	3123127753	PRESENCIAL
2023-08-02	rubencel@hotmail.com	RUDEGINO CELIS	0000	JUNTA DIRECTIVA SUBRED SUR	USME	3143009455	PRESENCIAL
2023-08-02	asouhtunal@hotmail.com	DARIO BAQUERO MARTINEZ	17133349	VEEDURIA ADECUACIÓN CAPS Y URGENCIAS EL TUNAL	TUNJUELITO	5637036 - 7415259	PRESENCIAL
2023-08-02	con.cabe@hotmail.com	DORIS JANNETH VARGAS JIMENEZ	52034662	ASOCIACIÓN USUARIOS DE SALUD USS EL TUNAL - ASOUHTUNAL	TUNJUELITO	5639398	PRESENCIAL
2023-08-02	asouhtunal@hotmail.com	CONSUELO LORA NIÑO	31888294	VEEDURIA ADECUACIÓN CAPS Y URGENCIAS EL TUNAL	PUNTE ARANDA	3117104620 - 3158014651	PRESENCIAL
2023-08-02	asouhtunal@hotmail.com	MARÍA ELENA AYALA SIERRA	39524483	ASOCIACIÓN DE USUARIOS USS EL TUNAL	TUNJUELITO	7501276 - 3143111038	PRESENCIAL
2023-08-02	participacion.tunjuelito@subredsur.gov.co	ANA MILENA BAYONA GOMEZ	52200295	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	OTRA	3118193509	PRESENCIAL
2023-08-02	mateoaristizabal.subredsur@gmail.com	MATEO ARISTIZABAL	SD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	SD	311 2476802	PRESENCIAL
2023-08-02	carlostovar.subredsur@gmail.com	CARLOS TOVAR	SD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	SD	SD	PRESENCIAL
2023-08-02	JSGONZALEZ@SALUDCAPITAL.GOV.CO	JOHANN SEBASTIÁN GONZÁLEZ VILLARRAGA	1030530748	SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD	KENNEDY	3112629838	PRESENCIAL
2023-08-02	SD	ANDRÉS HERNÁNDEZ	SD	CONSORCIO TUNAL 2022	SD	SD	PRESENCIAL
2023-08-02	SD	WILSON CARDOSO	SD	CONSORCIO TUNAL 2022	SD	SD	PRESENCIAL

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 1946-1957 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

7. COMPROMISOS:			
QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite aaaa-mm--dd)	QUIEN (Responsable)
Envío acta reunión	Envío por correo electrónico	15 agosto 2023	Ingeniero y Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Recorrido a las obras	Programación de recorrido y gestión de apoyo de transporte	Para septiembre	Ingeniero y Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Mesa de trabajo	Para construcción de informe de cierre veeduría en centro de salud Actualización de resolución de veeduría	Agosto	Veedores Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Seguimiento a recomendaciones	- Protección de escaleras de emergencia - calidad y garantía del piso, lo mismo que medidas de cuidado - protección a las válvulas de la red contra incendio.	Para septiembre	Ingeniero y Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

CARLOS TOVAR,

MATEO ARISTIZABAL Y

MARIA ELENA RESTREPO

SECRETARIO REUNIÓN

ANA MILENA BAYONA GÓMEZ



© 2023-03-31

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALA L101 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

Registro fotográfico recorrido a obras de Centro de Salud Tunal – agosto 02 de 2023



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALA L107 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

Registro fotográfico recorrido a Obras de Reorganización Urgencias – agosto 02 de 2023

