

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

EVENTO: REUNION ☐ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☒			
FECHA: 2024-06-12	HORA INICIO: 9:00 am	HORA FINAL: 12:00 m	REUNIÓN N°: 08-2024
LUGAR: Aula Múltiple Hospital El Tunal			
TEMA: Mesa de Dialogo seguimiento avances de obras El Tunal			
RESPONSABLE: Ingeniero Carlos Tovar		SECRETARIO: Notas por Ana Milena Bayona Gómez	

1. OBJETIVO:
Realizar asistencia técnica a los veedores de las obras El Tunal, en el marco de la veeduría al Convenio 2806257 de 2021 Fondo Financiero Distrital y Subred Sur: adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de urgencias, hospitalarios, quirúrgicos y de apoyo diagnóstico y terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal, en la mesa de dialogo de la veeduría obras El Tunal

2. PARTICIPANTES:					
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional"					
	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	Se adjunta lista de asistencia				
2					
3					
4					
5					
3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)					
1. Bienvenida y registro de asistencia 2. Seguimiento compromisos 3. Presentación avances de las obras en El Tunal 4. Acuerdos y compromisos Cierre de la reunión					

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)
Se verifica asistencia de veedores de las obras El Tunal, profesionales de consorcio e interventoría contratados para ejecución de la obra de Tunal, profesionales de la Oficina de Desarrollo Institucional para gestión de proyectos y profesional de Participación de la Subred Sur.
5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)
- Envío acta reunión. A los correos electrónicos registrados por los veedores, se envía el 14 de junio - Recorrido a las obras. Se programa próximo recorrido a las obras invitando a los ediles el 10 de julio a las 2:00 pm - Socialización de proyecciones de servicios en el edificio que está en proceso de construcción.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. Bienvenida y registro de asistencia


La profesional de participación de la Oficina de Participación Comunitaria de la Subred Sur y la gestora social del contratista, saludan a los asistentes y abren la reunión siendo las 9:20 am, recordando que el objetivo de la convocatoria, es socializar los avances en la obra de Tunal, la profesional de participación de la Subred Sur suministra formato de listado para el registro que corresponde.

3. *Presentación avances de obras El Tunal*

La gestora social del consorcio contratista y el director de la obra, hacen la presentación de los avances en la ejecución de las obras en El Tunal, en la cual se reorganizan los servicios de urgencias, ampliando además áreas de cirugía, rehabilitación y hospitalización.

Ante la novedad de video en noticias Caracol en la que una concejal presenta irregularidades en la ejecución de las obras El Tunal, especialmente el punto en el cual se tiene Convenio Interadministrativo vigente entre la Subred Sur y el Fondo Financiero de la Secretaria Distrital de Salud, hasta el 04 de octubre de 2024, fecha en la cual la concejal manifiesta debería entregarse el edificio.

Se explica a los asistentes a la reunión que se debe diferenciar entre el convenio interadministrativo que suministra a la Subred Sur el recurso para el desarrollo de la obra de acuerdo a las vigencias que corresponden, a este convenio se le han realizado prorrogas y adiciones actualizando las novedades según corresponda, siendo aprobados por comité técnico, dichas prorrogas no pueden superar el tiempo del convenio, y la Subred junto con la interventoría presentan la documentación correspondiente para hacer el trámite administrativo.

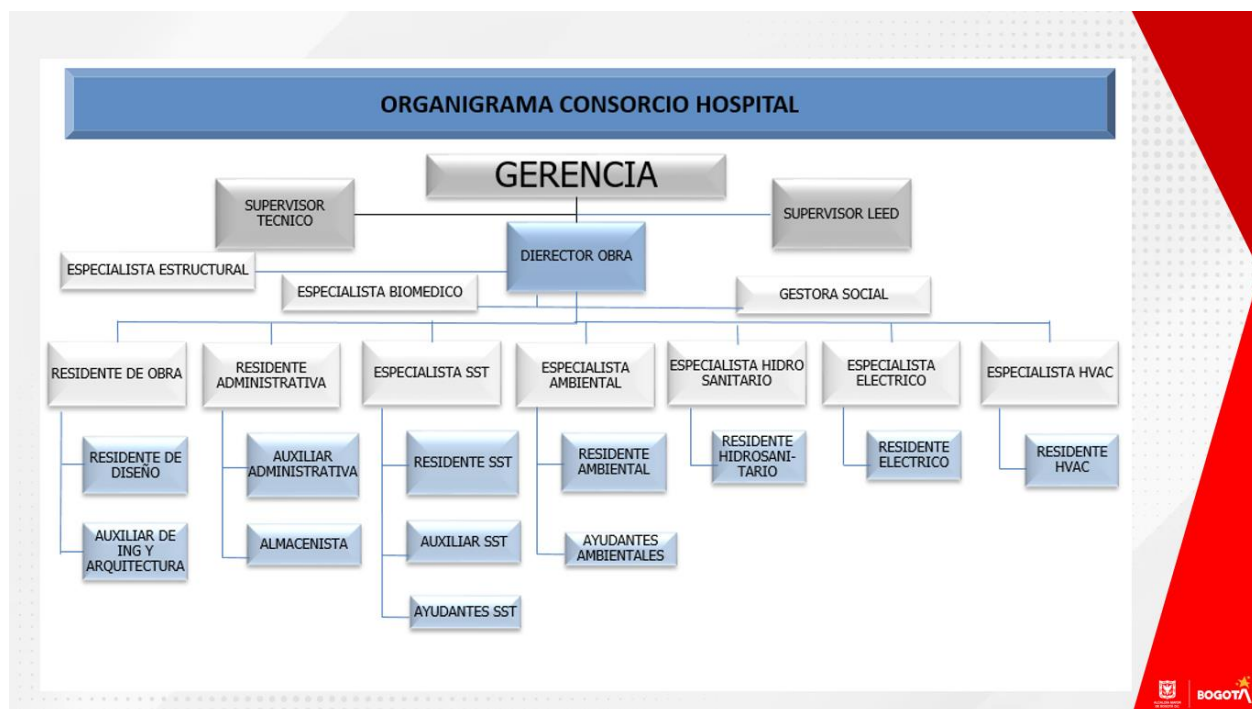

El contratista y la interventoría tienen un contrato llave en mano por la obra con la Subred Sur, el cual tiene vigencia hasta el 25 de agosto y los recursos para sus pagos, dependen de lo aprobado en los comités técnicos con respecto al convenio interadministrativo. Por lo cual lo manifestado por la concejal sería parcialmente correcto, y seguramente ella no pidió informe sino documentación soporte del convenio, por lo

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALA DE SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

cual no cuenta con la información sobre el desarrollo propio de la contratación.

La comunidad, recomienda a los contratistas que se pueda emitir un comunicado para que se aclaren las cosas que se dijeron en el noticiero, lo cual también ayuda al ejercicio de los veedores, teniendo en cuenta que personas de la comunidad les ha pedido aclarar lo que se dijo en el noticiero y las actuaciones como veedores.

- Se cuenta con un avance del 16,5% en el trabajo de la obra, presentándose con corte al 07 de junio un retraso del 0.4% por las novedades con respecto al clima y prevención de talud de tierra en el área y etapa de la obra, se han realizado plan de contingencia contemplando jornadas mas largas y fines de semana para no afectar de forma negativa la obra.

- Especifican que se esta haciendo actualizacion en costos de la obra, teniendo en cuenta que el convenio fue aprobado con precios de 2021, y se estan teniendo grandes diferencias con los materiales, se busca presentar la actualizacion ante comité tecnico para aprobación de prorroga y adiciones. Siendo normal este tipo de trámites en las obras de infraestructura con la Secretaria Distrital de Salud.

URGENCIAS TUNAL

• Convenio Interadministrativo 2806257-2021
• Fecha Inicio: 26/02/2024
• Fecha Terminación: 04/10/2024

CONVENIO



• Llave en mano: 5008-2022
• Interventoría: 5009-2022
• Inicio: 20/05/2022
• Reinicio de Contrato: 26/02/2024

CONTRATOS DERIVADOS



• 16,99% - Avance programado
• 16,46% - Avance ejecutado

% AVANCE CON CORTE 04 JUNIO DE 2024

%


AVANCES

1. Firma de cesión del contrato CONSORCIO HOSPITAL
2. Revisión de diseños y documentos contractuales
3. Contratación de personal con 42 Operativos y 16 Administrativos
4. Armado y fundida cimentación superficial Zona B - Vigas de Cimentación: 27,47 M3 y Zapatas 70,68 M3
Total: 98,15 M3 y Aproximado de 13,000 Kg de Acero de Refuerzo
5. Inicio de excavaciones para zapatas y vigas de cimentación de la zona A


- Cuentan en el momento con 58 empleados de los cuales son 42 son operarios, indicando ademas que de ellos 22 son residentes de la localidad de Tunjuelito. Se especifica que se hizo contacto con la alcaldia local para apoyar la convocatoria, tambien indicando que ha sido dificil completar el número requerido de operarios, puesto que es pesado y hay alta rotación, situación que han solventado con personal de Villavicencio y Acasias y esperan se regule a medida que se requieran nuevos perfiles.



FRENTES DE OBRA

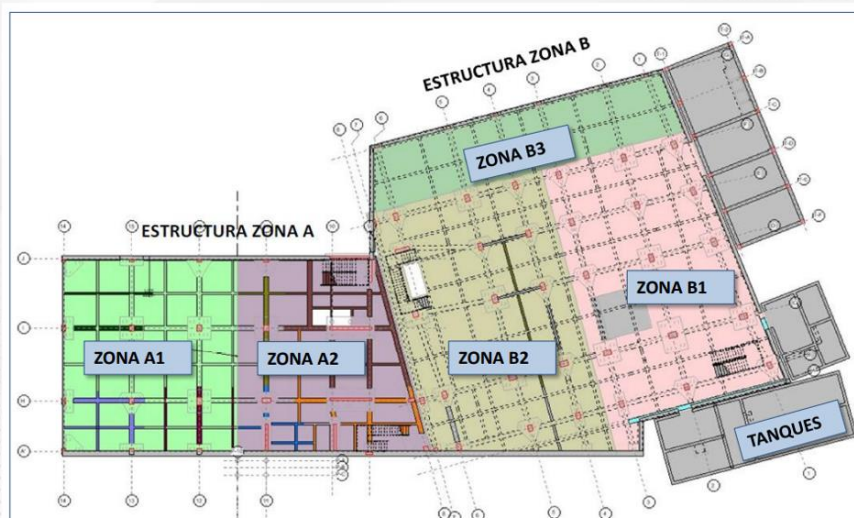

AVANCE GRAFICO

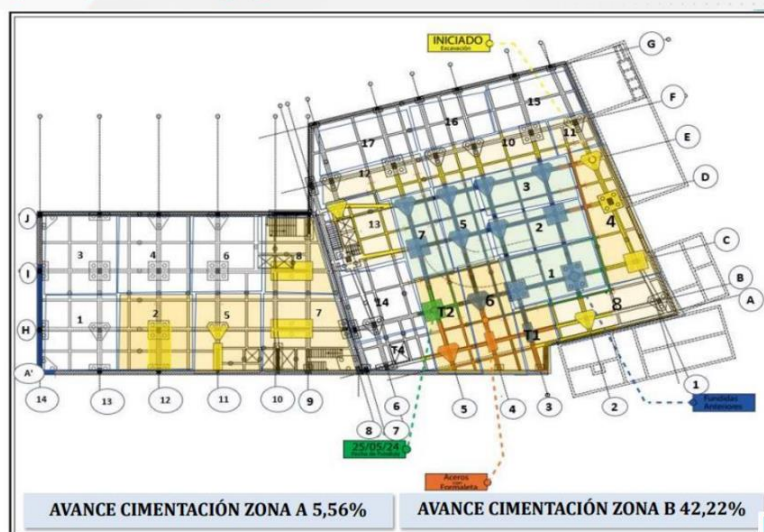

- La profesional del consorcio de SST, informa que no se han tenido accidentes de trabajo, pero si es frecuente que se tengan lesiones por desgarro, por lo cual en las mañanas se inician labores con ejercicios de calentamiento, se recuerdan técnicas de levantado de peso y se hacen pausas para alimentación a las 9 am por 20 minutos, a las 12 por una hora y media y a las 3 pm por 15 minutos.
- La profesional social informa que se realizará la presentación al comité vecinal de la obra, el 19 de junio, a las 9:00 am, en salón comunal del conjunto residencial Bolívar, solicitando a los veedores que viven cerca del Hospital a los presidentes de junta comunal o administradores de conjuntos, para que sea una participación amplia.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALA L-07
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S. E

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V5

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO ÁREA TÉCNICA

FOTOS AVANCE DE OBRA		
PROYECTO HOSPITAL TUNAL- INFORME No.	2	Semana 8 a 15 De 18 Abril a Junio 7 de 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO		



TRAMOS: EJES 5 VIGAS 28,33,50 Y VIGUETAS 28,44,53

25 Mayo de 2024





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S. E

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO


CA-FT-02 V5

REGISTRO FOTOGRÁFICO ÁREA AMBIENTAL Y SST





GESTIÓN SOCIAL

1. Ejecución Plan de Gestión Social PGS
2. Programación de Socialización Plan de Emergencias a la comunidad
3. Programas de Capacitación al personal operativo



ESTRATO	CANTIDAD
1	9
2	39
3	11
4	2
5	1
6	0



Los veedores realizan preguntas sobre:

- Piezas comunicativas e informativas en porteria del Hospital El Tunal, dado que personal de seguridad del hospital esta dirigiendo a los interesados a trabajar en la obra a la sede principal de la Subred Sur.
- Quienes deberian responder al informe de noticias Caracol sobre la obra del Tunal, en la cual habla

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 1946-1950 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

una concejal de Bogotá. Se explica a los asistentes que la Subred Sur está revisando con el área de comunicaciones la información que se emitió en el informe y buscará la asesoría de la Secretaría Distrital de Salud para establecer el paso a seguir.

Acuerdos y compromisos

- La vocera de la veeduría realizará envío de informe de las acciones de la veeduría para la JAL Tunjuelito, ante la solicitud de los ediles, para lo cual se dará asistencia técnica desde la Oficina de Participación de Tunal.
- Envío con el acta de la presentación de los contratistas.
- Programar mesa de diálogo de veedores ampliada para recorrido a la obra el 10 de julio a las 2 pm por petición de los Ediles.
- Citar a los profesionales de la Subgerencia de Prestación de Servicios para la socialización de la proyección de servicios para el nuevo edificio.

7. COMPROMISOS:			
QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite aaaa-mm--dd)	QUIEN (Responsable)
Envío acta reunión	Envío por correo electrónico	2024-06-21	Ingeniero y Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Recorrido a las obras	Asistencia de los veedores, ediles y supervisor de la obra	2024-07-10	Ingeniero y Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Citación Subgerencia de Prestación de Servicios de la Subred Sur	Socialización de proyección de servicios de salud en el edificio de Tunal	Mesa de diálogo agosto	Ingeniero y Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

CARLOS TOVAR

SECRETARIO REUNIÓN

ANA MILENA BAYONA GÓMEZ



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALA L-01 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO		CA-FT-02 V5

Registro fotográfico – junio 12 2024





CA-FT-02 V5

CUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.						PS-PAR-FT-05 V2	
LISTA ASISTENCIA REUNION MIEMBRO DE LA COMUNIDAD							
FECHA:	HORA DE INICIO HORA TERMINACIÓN	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNION:	Mesa de diálogo Presentación avances		ESPACIO COMUNITARIO:
					LOCALIDAD	TELÉFONO/CELULAR	
12 - 06 - 2024							
No							FIRMA
1	Wansol Otaro P	325588470	cursado 900 p. tel	Tunguelito	3112061568	monoterp@prol.com	Veeduría Obras El Tunal
2	Fosina Garcia	8047360	SURCO 5m.	TUNGUELITO	3043724648	Fosina Garcia. Suredor @tmell.com	
3	Eduar Fosina Alvarado	117'052-759	Surco 5m.	Tunguelito	3138078/82	libre erección 1941@gmail.com	
4	JUDY C. BARRERA	1654481	Colaborador HONORARI	TUNGUELITO	3025400460	hnp.tunelapocay	
5							
6							
7							
8							



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALA DE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD SUR E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V5

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				PS-PAR-FT-05 V2				
LISTA ASISTENCIA REUNION MIEMBRO DE LA COMUNIDAD								
FECHA:		HORA DE INICIO	q:00am	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNION:				
12-06-24		HORA TERMINACIÓN	12:00m	Mesa de dialogo con presentación avances				
No	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	TELEFONO/CELULAR	ESPACIO COMUNITARIO:	CORREO	FIRMA
1	Ara Milena	Bayona Gomez	52200293	Subred Sur OF RC y SC	Tunelito	311-8193309	participacion Salud Tunelito@gmail.com	
2	María Estela	Nino Arancibia	39285463	Asamblea	Engativá	311-886177	—	
3	Ma. Nidia	Medina	41439616	Asamblea	Engativá	3203618796	Ma. Nidia Medina@gmail.com	
4	Campos	Campos	41222288	Asamblea	Engativá	3115638378	com. cabeleira@gmail.com	
5	Daniela	Jaqueline	41155343	Asamblea	Engativá	3205807839	—	
6	Rubén	Calis	41126533	Asamblea	Engativá	3113009455	Ruben Calis@hotmail.com	
7	Elvira	Apel S.	39524483	Asamblea	Engativá	3113110888	—	
8	Daniela	Garzon Betancur	40300859	Consejo Hospital	Engativá	3185050336	hse.consejohospital@gmail.com	
