

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V6

EVENTO: REUNIÓN ☒ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☐			
FECHA: 16 de Febrero 2024	HORA INICIO: 9:00 a.m.	HORA FINAL: 11:30	REUNIÓN N°: 02
LUGAR: Salón Sótano Meissen			
TEMA: MESA DE DIÁLOGO VEEDURÍA “CONVENIO 2980595 DE 2021- “PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y TERMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LA TORRE 1 DE LA USS MEISSEN.			
RESPONSABLE: Mónica Salguero. Líder Proyectos Subred Integrada De Servicios De Salud Sur.		SECRETARIO: Notas: Rosa T. Quintero. Profesional Participación Subred Sur Ciudad Bolívar.	

1. OBJETIVO:
-Realizar mesa de dialogo veeduría convenio 2980595 de 2021- “proyecto adecuación, ampliación, reforzamiento, reordenamiento y terminación y dotación de la Torre 1 de la USS Meissen.

2. PARTICIPANTES: Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 “Lista de asistencia institucional”																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>NOMBRE</th> <th>CARGO</th> <th>CORREO</th> <th>DEPENDENCIA/USS</th> <th>FIRMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA	1						2						3						4						5											
	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA																																					
1																																										
2																																										
3																																										
4																																										
5																																										

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)
Saludo y presentación de los participantes 2.Presentación del objetivo de la reunión. 3. Lectura del acta anterior 4.Seguimiento a compromisos 5.Socialización avances convenio. 2980595 DE 2021- “PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y TERMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LA TORRE 1 DE LA USS MEISSEN. 6.Aclaración de inquietudes a la comunidad. 7.Recorrido a la obra 8.Cierre.

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)
-5 veedores -Integrante de la asociación de Usuarios Hospital Meissen. Sra. Aracely Galindo - Ingeniero Carlos Eduardo Serrano. Subred Sur. -Alejandro Leal. Firma Interventora -Miguel Ortegón. Firma interventora -Rosa Tulia Quintero. Profesional Oficina Participación Comunitaria Subred Sur Ciudad Bolívar

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V6

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)	
NA	

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:	
Siendo las 9:00 a.m. se da inicio a la reunión. 1. La profesional de participación de la subred Sur Ciudad Bolívar, Rosa Tulia Quintero da un saludo de bienvenida y agradece la asistencia a esta mesa de diálogo, 2. Presentación del objetivo de la mesa de diálogo. Dar a conocer los avances del convenio. 2980595 DE 2021- "Proyecto adecuación, ampliación, reforzamiento, reordenamiento y terminación y dotación de la Torre 1 de la USS Meissen", y realizar recorrido a la obra. 3. Lectura del acta anterior. La cual es aprobada por unanimidad 4. Seguimiento a compromisos. NA 5. Socialización avances del convenio 2980595 DE 2021- "PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y TERMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LA TORRE 1 DE LA USS MEISSEN. El ingeniero Carlos Serrano. Informa sobre el avance de la obra que va en un 98,00% de lo programado y un 96,41% en lo ejecutado. Estado En Ejecución Valor del contrato obra: \$13.479.307.231 y Valor facturado: \$10.656.317.041. Seguidamente presenta la línea de tiempo del proyecto  Línea de tiempo proyecto 26/04/2022 Fecha de inicio de obra 25/09/2023 Fecha de terminación inicial 08/10/2023 Fecha de terminación contractual 16/02/2024 Fecha de terminación real	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALA 100
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S. E

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO


CA-FT-02 V6

Avances proyecto 2023 – Logros alcanzados

- Entrega fase 1 urgencias julio 2023
- Inicio adecuaciones servicio de ginecoobstetricia junio 2023 fecha de entrega 25 de noviembre 2024.
- Inicio adecuaciones servicio de Esterilización junio 2023 fecha de entrega 11 de enero 2024.
- Inicio fase 2 urgencias agosto 2023 – fecha de entrega 16 de febrero 2024

Finalmente socializa un registro fotográfico del piso de ginecoobstetricia, del piso de esterilización y del piso de urgencias, para luego hacer el recorrido con el grupo de veedores para verificar esta información.

Registro fotográfico Piso 2 Ginecoobstetricia

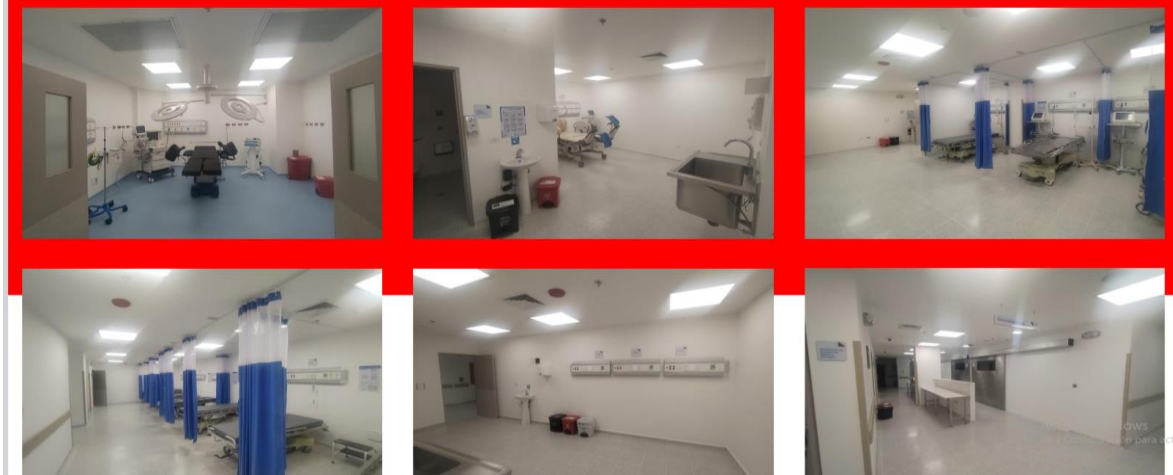

Registro fotográfico Piso 2 Esterilización





Registro fotográfico piso 1 (Urgencias Fase 2)



6. Aclaración de inquietudes a la comunidad.

-El Sr. Agustín Moreno pregunta si la fachada del Hospital si ya se terminó de pintar? El ingeniero Carlos, refiere que ya se terminó la fase de pintura de todo el hospital, de igual forma se pradiizó y se colocó césped.

-El Sr. Epifanio Gutiérrez, pregunta por el valor del metro cuadrado de la pintura de la fachada. Respuesta. 45.500 pesos metro cuadrado.

-El Sr. Epifanio felicita a la interventoría y a la Subred por la gestión realizada para que se este dando a feliz término la obra y por el buen manejo de los recursos.

-También pregunta don Epifanio por la garantía de las pólizas de cumplimiento, debido a que hoy 16 de febrero se debía entregar la fase 2 del servicio de urgencias. El ingeniero Carlos refiere que el día lunes 19 de febrero se va a realizar un comité técnico para revisar las pólizas de cumplimiento y que por parte del contratista se de una explicación del por qué no se entrego para la fecha que estaba programada.

-La Sra. Jacqueline Pico. Sugiere que se haga más control a la colocación de la pintura para que quede perfecta.

7. Recorrido a la obra. Se realiza recorrido a la obra, con el fin de verificar la información recibida en la mesa de diálogo.

Se anexa registro fotográfico.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALA 1007
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V6



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALA L107 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V6	



7. Siendo las 12:00 m se da por terminada la reunión.

8. COMPROMISOS:			
QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite aaaa-mm--dd)	QUIEN (Responsable)
Realizar mesa de diálogo y recorrido obra	reunión	Marzo 30 2024	Rosa Tulia Quintero. Profesional Participación Subred Sur.

Se anexa lista de asistencia



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V6

FECHA		HORA DE INICIO	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNIÓN	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE LA COMUNIDAD	LOCALIDAD	NÚMERO TELEFONO Fijo	NÚMERO CELULAR	CORREO	FIRMA
16-02-24		9:00 a.m.	Socializar Avances Del TOME 2 Revisión obra TOME 2						
16-02-24									
1	RODRIGUEZ	171911087	VEEDURIA TOME 2	19		320381685			
2	RODRIGUEZ	20983041	—	19		319326040			
3	LIBARDIN HUERTA	414484204	VEEDURIA	19		3125446914			
4	Sorcelina paco	52373502	veedor	19		3115865357			
5	José Carlos	2315315	veedor	19		3212200256			
6	EPITAFIO OBISPO	79417973	veeduría TOME 2	19		194417973			
7	Nejando Leal	79552593	Interventor	—		—			
8	Miguel Ortega	79555964	Interventor	—		—			
9	Carlos Ed. Serna	1010209384	Subred Sur	—		3057097575			
10	Rosa T. Quintero	52921266	Subred Sur Pe.	—		3103324271			
11									
12									
13									
14									
15									

EN CONSTANCIA SE FIRMAN:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

Rosa Tulia Quintero

Rosa T. Quintero

SECRETARIO REUNIÓN

Notas: Rosa T. Quintero

Profesional Participación Subred Sur C. Bolívar
