

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V6

EVENTO: REUNION ☒ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☐			
FECHA: 2023-10-13	HORA INICIO: 10:00 am	HORA FINAL: 12:00 m	REUNIÓN N°: 01-2023
LUGAR: Oficina de Participación El Carmen – Herramienta MEET			
TEMA: Seguimiento de avances obras El Tunal			
RESPONSABLE: Mateo Aristizabal - María Elena Restrepo		SECRETARIO: Notas por Ana Milena Bayona Gómez	

1. OBJETIVO:
Realizar asistencia técnica en reunión de seguimiento de veeduría al Convenio 2806257 de 2021 de adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal y Convenio 1223 de adecuación y dotación CAPS El Tunal – Fondo Financiero Distrital y Subred Sur.

2. PARTICIPANTES:					
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional"					
	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	Edgar Loaiza	Veedor	libraescorpion1941@gmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial
2	Rosalba Gutiérrez	Veedora	asodeuhvh3@gmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial
3	Concepción Castañeda	Veedora	Con.cabe@hotmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial
4	Nelly Saldarriaga	Veedora	nellya@hotmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial
5	Carmen Peña	Veedora	asodeuhvh3@gmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial
6	Luis Carlos Quitian García	Veedor	asouhtunal@hotmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial
7	María Estela Niño	Veedora	asouhtunal@hotmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial
8	Consuelo Lora	Veedora	asouhtunal@hotmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial
9	Doris Janneth Vargas	Veedora	Con.cabe@hotmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial
10	Elizabeth Rivera	Veedora	asodeuhvh3@gmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial
11	Mateo Aristizabal	Ingeniero	Mateoaristizabal.subredsur@gmail.com	Subred Sur – Gestión de proyectos	Herramienta MEET
12	María Elena Restrepo García	Médico Especialista proyectos	Mariaelena2219@hotmail.com	Subred Sur – Gestión de proyectos	Herramienta MEET
13	Johann Sebastián González	Referente Control social	JSGonzalez@saludcapital.gov.co	Secretaría Distrital de Salud - DPSGTYT	Presencial
14	Ana Milena Bayona Gómez	Profesional Universitario	participacion.tunjuelito@subredsur.gov.co	Of. Participación Comunitaria	Presencial

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)
1. Bienvenida a los participantes y registro de asistencia 2. Seguimiento a compromisos 3. Presentación avances de ejecución obras Tunal 4. Acuerdos 5. Cierre

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V6

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

Se verifica asistencia de 10 veedores, gestor de control social SDS, profesionales de gestión de proyectos y profesional de participación de la Subred Sur.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

- Envío acta reunión. Se envía por correo electrónico el 20 de septiembre.
- Actualización de resolución veeduría. Se realiza la radicación de la documentación de los veedores el 18 de septiembre, sin embargo se terminan de recaudar las cedulas el 30 de septiembre, está pendiente el revisión y respuesta del trámite con Personería de Bogotá.
- Documento de evaluación e informe de veeduría. Se elaboró documento el 31 de agosto y está pendiente del ajuste con la entrega final de veeduría en Centro de Salud Tunal, para la radicación de documento a gerencia de la Subred Sur, SDS, Asociaciones de Usuarios de la Subred Sur.

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. Bienvenida y registro de asistencia

Se da inicio a la reunión siendo las 10:00 am de manera presencial en Oficina de Participación El Carmen y aplicación MEET, se cuenta con la presencia de 10 veedores, profesional de SDS y profesionales de gestión de proyectos, y profesional de participación de la Subred Sur.

La bienvenida la realiza la profesional de la Oficina de Participación de la Subred Sur.

3. **Presentación avances convenios de obras El Tunal**

La médico especialista María Elena Restrepo y el ingeniero Mateo Aristizabal, saludan a los asistentes y agradecen la participación, explicando que realizaron presentación de los avances de dos proyectos que se adelantan en el predio de Tunal:

Avances de la obra de Centro de Salud Tunal: el ingeniero Mateo Aristizabal, indica que se esta ultimando la entrega por parte del contratista y la intevectoria, iniciando la etapa de liquidacion del contrato, informando que los documentos, productos y pruebas de entrega estan certificadas en casi un 100%.

Se hace un recuento de seguimiento a las recomendaciones de recorrido de agosto:

- A las valvulas de la red contra incendio se les hizo una caja inspeccionable, dejando libre del la vista y acceso de los usuarios.
- Control de escaleras de emergencia, se hizo observacion a personal de seguridad y se instalaron camaras de vigilancia para controlar el transito de los usuarios por el area.
- Se realizaron ajustes en las ventanillas de facturacion y farmacia, dejando orificios para mejorar la comunicacion de los usuarios y los colaboradores.
- Circulacion de usuarios entre edificios, se cuenta con turno de seguridad en el parqueadero que une los dos edificios, controlando la circulacion de usuarios y orientando según corresponda, teniendo separado el ingreso de hospitalizacion y urgencias y el centro de salud.
- Cambio de pieza de fachada, se realizo antes de realizar la inauguracion el cambio de pieza abollada de la fachada.
- Se hizo instalacion de un biciclatero al ingreso de consulta externa.
- Se hizo la instalacion y puesta en funcionamiento de puerta de ingreso exclusiva de consulta externa
- Se entrego a personal de servicios generales el manual de cuidado y limpieza de los pisos del edificio, recomendando no usar maquinas con material abrasivo y no usar abundante agua.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD SUR E.S.E.


SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V6

1

Proyecto:
Adecuación y Dotación Centro de Salud El Tunal

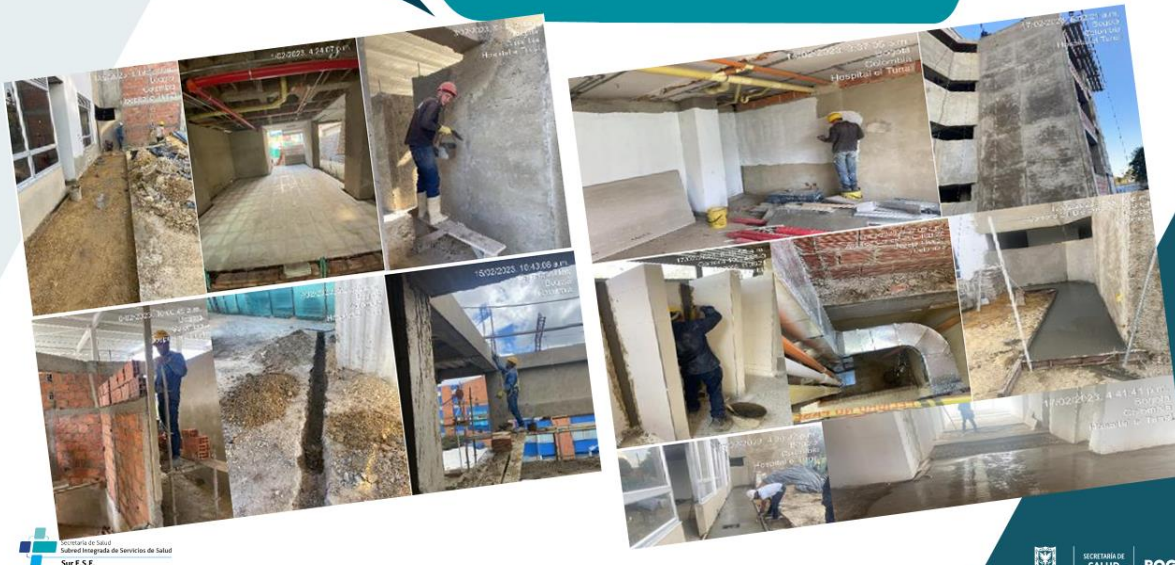

Los veedores realizan intervencion con recomendaciones sobre:

- Observacion para ubicar barandales o rejilla en los ventanales, puesto que las personas se recuestan y pueden presentarse dificultades. El ingeniero Mateo Aristizabal, informa que la solicitud debe ser derivada a la direccion administrativa, puesto que ya esta en etapa de entrega de obra y no hay mas recursos para dicha solicitud.
- Solicitud para instalacion de una nevera y un estand para farmacia, dado que se reporta que tiene poco espacio para guardar los medicamentos. El ingeniero Mateo Aristizabal, informa que la solicitud debe trasladarse a la direccion de complementarios, dando claridad que esa area fue la encargada de proyectar la dotacion y mobiliario de la farmacia.
- Reporte de diferentes problemas en los baños por inundacion o escapes, ademas de problemas con las descargas de los sanitarios. El ingeniero Mateo Aristizabal, informa que se presentaron dificultades por la presion de llegada del agua, lo cual estaba rompiendo los sanitarios, por lo cual el contratista hizo cambio por garantia con los proveedores y se estan haciendo pruebas y ajustes en la calibracion de las bombas de agua.
- Problemas con las sillas de auditorio, porque se salieron los tornillos. El ingeniero Mateo Aristizabal, informa que dado el reporte de los veedores, se realizo el ajuste y fijaron las sillas asegurandolas, quedando en la actualidad en uso y sin inconvenientes.
- Uso de los baños mixto, posibilidad de hacer nueva distribucion de los baños en los pisos. El ingeniero Mateo Aristizabal informa que cada area de baño esta señalizada y se ha encontrado que la confusion en el uso es cultural de los usuarios, por lo que ha recomendado a atencion al usuario y el personal de seguridad informen la ubicación de los baños desde el ingreso para que puedan ubicar el uso según corresponda. Tambien informa que el personal de seguridad esta controlando el uso de los baños de discapacidad, puesto que se presentaron robos de las llaves de los lavamanos y accesorios de sanitarios. Por otra parte no se podria hacer redistribucion de los baños, debido a que se tendrian que hacer modificaciones para orinales y se perderian garantias.
- Se indico que el uso de baño de discapacidad en el cuarto piso es para los colaboradores. Lo anterior se verificara con la profesional de enlace. El ingeniero Mateo Aristizabal informa que en los diferentes pisos se dejo un baño para los colaboradores junto a las cajas de facturacion, pero en el cuarto piso no hay baño de colaboradores.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALA 100
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S. E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V6



Avances en la obra de urgencias: El ingeniero Mateo Aristizabal, informa que el ingeniero Carlos Tovar, supervisor de la obra de urgencias se excusa por cruce de su agenda con reunion citada por la gerencia. Informando que realizará un resumen general de los avances y llevara al ingeniero Tovar las inquietudes que se presenten.

- Se encuentra en construcción los muros de contencion del perimetro del edificio.
- Se estan realizando trabajos de cimentacion superficial
- Se inician trabajos para los contruccion de vigas de cimentacion y pilotes de soporte.
- Se aprobo por el comité tecnico un plan de contingencia, dado el porcentaje de ejecución acumulado hasta la fecha, acordando trabajar de domingo a domingo, aumenar el personal en los frentes de obra pasando de 41 a 80, ampliar horarios de trabajo por turnos.

Se realizan intervenciones de los veedores:

- solicita tener seguridad que se cuenta con el recurso garantizado para culminar la obra y para etapa de dotacion. El ingeniero Mateo Ariztizabal, informa que los recursos de la obra y dotacion estan garantizados por convenio vigente, considera que el cambio de adminitracion de la ciudad y de la Subred Sur no tendrian que suponer atrasos o problemas con la ejecución de la obra.
- Preguntan los veedores si se estan adelantando procesos de sancion o suspension al contratista. El ingeniero Mateo Aristizabal, indica que se vienen haciendo mesas de trabajo con el contratista e interventoria para establecer acuerdos dado el retraso de cronograma y diferencias entre los resultados de estudios y diseños y el area de construccion real.
- Preguntan por el porcentaje de avances de la obra y aclaracion de plan de contingencia. El ingeniero Mateo Aristizabal, indica que tienen avance de 15,82% informa que el plan contingencia busca que el contratista se organice en tiempos y personal para aumentar el porcentaje de ejecución.
- Solicitan información para vincular a personal para la obra. El ingeniero comparte pieza comunicativa para hacer llegar las hojas de vida de los interesados.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SAL CES Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V6

- Los veedores recuerdan que la Alcaldesa Local indico que la fecha de entrega de la obra de edificio de urgencias seria en julio de 2024. El ingeniero indica que los planes de contingencia y las mesas de trabajo con los contratistas buscan que se adelante en el cumplimiento de cronograma.

2

Proyecto:
Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal



7. DECISIONES TOMADAS

Acuerdos y compromisos

- Tramitar para que atención al usuario y personal de seguridad informen sobre ubicación y uso de baños según su género.
- Seguimiento de la presión de sanitarios del Centro de Salud
- Tramitar con la dirección administrativa la instalación de barandales en los ventanales del tercer y cuarto piso.
- Seguimiento a cuidado de los pisos del centro de salud
- Actualización de la resolución de la veeduría, seguimiento a resultados del trámite
- Dar información sobre los procesos sancionatorios a contratista de obras en urgencias, teniendo en cuenta retraso en cronograma
- Información de recepción de hojas de vida en la obra de urgencias.
- Radicación de informe y evaluación de la veeduría a gerencia de la Subred Sur, SDS y asociaciones de usuarios.
- Recorrido a las obras de urgencias se programa en noviembre

Cierre de la reunión.

Cierra la reunión siendo las 12:00 m, con el registro de los formatos de seguimiento por parte de los veedores.

Se proyecta próxima reunión según lo acordado para el 02 de noviembre, horario por definir, teniendo opción presencial, explicando que por el momento deben llegar por sus propios medios.

Se adjuntan pantallazos de la reunión virtual y registro de asistencia

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALA L107 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V6

8. COMPROMISOS:			
QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite aaaa-mm--dd)	QUIEN (Responsable)
Envío acta reunión	Envío por correo electrónico	2023-10-30	Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Recorrido de las obras de Tunal	Reunión presencial para verificación de avances	2023-11-02	Veedores Profesionales de gestión de proyectos Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Actualización de resolución veeduría	Seguimiento de la actualización de resolución de la veeduría	2023-10-30	Profesional de DPSGTYT SDS
Documento de evaluación e informe de veeduría	Radicación de documento evaluación e informe a gerencia, SDS y asociaciones	2023-10-30	Veedores Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

MATEO ARISTIZABAL - MARÍA ELENA RESTREPO

SECRETARIO REUNIÓN

ANA MILENA BAYONA GÓMEZ



© 2023-03-31

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V6

Veedores Tunal PS-PAR-FT-05 V2 LISTA ASISTENCIA REUNIÓN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD octubre 13 2023 (respuestas)

Fecha temporal	Dirección de correo electrónico	NOMBRE Y APELLIDO	NUMERO DOCUMENTO (8 IN PUNTO 8 Y 8 IN COMA 8) *	NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD DE RESIDENCIA	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
2023-10-13	asovhermosa@gmail.com	Rosaiba Gutierrez	20263713	VEEDURIA ADECUACIÓN CAPS Y URGENCIAS EL TUNAL	CIUDAD BOLIVAR	312 5800058	CELULAR
2023-10-13	nelya@hotmail.es	Nely Saldarriaga	21551479	VEEDURIA ADECUACIÓN CAPS Y URGENCIAS EL TUNAL	CIUDAD BOLIVAR	3212979245	CELULAR
2023-10-13	asouhtunal@hotmail.com	CONSUELO LORA NIÑO	31888294	VEEDURIA ADECUACIÓN CAPS Y URGENCIAS EL TUNAL	PUEBLO ARANDA	3117104620 - 3158014651	CELULAR
2023-10-13	ibraescorpion1941@gmail.com	Edgar Lozano Alzate	17052759	VEEDURIA ADECUACIÓN CAPS Y URGENCIAS EL TUNAL	TUNJUELITO	3138078184	CELULAR
2023-10-13	participacion.tunjuelito@subredsur.gov.co	Ana Milena Bayona Gómez	52200295	VEEDURIA ADECUACIÓN CAPS Y URGENCIAS EL TUNAL	OTRA	3118193509	CELULAR
2023-10-13	con.cabe@hotmail.com	CONCEPCIÓN CASTAÑEDA BERMUDEZ	41722948	VEEDURIA ADECUACIÓN CAPS Y URGENCIAS EL TUNAL	TUNJUELITO	56393378	CELULAR
2023-10-13	eliriga78@hotmail.com	MARÍA DEL CARMEN PEÑA	41583245	VEEDURIA ADECUACIÓN CAPS Y URGENCIAS EL TUNAL	CIUDAD BOLIVAR	3123127753	CELULAR
2023-10-13	JSGONZALEZ@SALUDCAPITAL.GOV.CO	Johann Sebastián González Villamaga	1030535748	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	KENNEDY	3112629838	CELULAR
2023-10-13	con.cabe@hotmail.com	DORIS JANNETH VARGAS JIMENEZ	52034662	ASOCIACION USUARIOS DE SALUD USS EL TUNAL - ASOUHTUNAL	TUNJUELITO	56393398	CELULAR
2023-10-13	Luisquitan@gmail.com	LUIS CARLOS QUITIAN GARCIA	79825111	VEEDURIA ADECUACIÓN CAPS Y URGENCIAS EL TUNAL	RAFAEL URIBE URIBE	3125312525	COMPUTADOR
2023-10-13	eliriga78@gmail.com	ELIZABETH RIVERA GALEANO	41707595	VEEDURIA ADECUACIÓN CAPS Y URGENCIAS EL TUNAL	CIUDAD BOLIVAR	3005787094	COMPUTADOR
2023-10-13	mateoaristizabal.subredsur@gmail.com	MATEO ARISTIZABAL	SD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	SD	311 2476802	CELULAR
2023-10-13	mariaelena2219@hotmail.com	MARIA ELENA RESTREPO GARCIA	43049905	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	TUNJUELITO	3166182300	CELULAR
2023-10-13	maesniar1020@gmail.com	MARÍA ESTELA NIÑO ARCINIEGAS	39528463	ASOCIACION USUARIOS DE SALUD USS EL TUNAL - ASOUHTUNAL	ENGATIVA	3204839516	CELULAR

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V6	

