

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

EVENTO:	REUNION ☐	MESA DE TRABAJO ☐	CAPACITACIÓN ☐	OTRO ☒
---------	----------------------------------	--	---------------------------------------	--

FECHA: 2023-04-15	HORA INICIO: 9:00 am	HORA FINAL: 12:30 pm	REUNIÓN N°: 03-2023
LUGAR: Hospital El Tunal – Área de obras: Centro de Salud y Reorganización Urgencias			
TEMA: Recorrido de obras y seguimiento avance de obras – Veeduría Obras Tunal			
RESPONSABLE: Ingeniero Carlos Tovar y Doctora María Elena Restrepo		SECRETARIO: Notas por Ana Milena Bayona Gómez	

1. OBJETIVO:
Realizar asistencia técnica de recorrido a las obras en el marco de la veeduría al Convenio 2806257 de 2021 Fondo Financiero Distrital y Subred Sur: Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal y el Convenio 1223 2017 Fondo Financiero Distrital y Subred Sur: Adecuación y Dotación Centro de Salud El Tunal

2. PARTICIPANTES:					
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 “Lista de asistencia institucional”					
	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	Concepción Castañeda	Veedora	Con.cabe@hotmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial
2	Rosalba Gutiérrez	Veedora	asodeuhvh3@gmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial
3	María Ninfa Rodríguez	Veedora	ma.ninfarodriguez@gmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial
4	Edgar Loaiza	Veedor	libraescorpion1941@gmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial
5	Darío Baquero Martínez	Veedor	asouhtunal@hotmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial
6	Aura Beatriz Vargas	Veedora	asouhtunal@hotmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial
7	Nelly Saldarriaga	Veedora	nellya@hotmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial
8	José Yesid Herrán Mosos	Asociado	jherranmosos@yahoo.com	Asociación Usuarios USS Tunjuelito	Presencial
9	Cecilia Suarez	Asociada	asouhtunal@hotmail.com	Asociación Usuarios USS El Tunal	Presencial
10	Luz Marina Pérez	Asociada	lumaperm1955@gmail.com	Asociación Usuarios USS El Tunal	Presencial
11	Flor Alba Díaz	Asociada	asouhtunal@hotmail.com	Asociación Usuarios USS El Tunal	Presencial
12	Ana Elisa Linares	Asociada	No tiene	Asociación Usuarios USS Tunjuelito	Presencial
13	Ana García	Líder comunitaria	No tiene	Barrio El Carmen	Presencial
14	Marco Fidel Suarez	Secretario	marcofidel249@hotmail.com	COPACOS Tunjuelito	Presencial
15	Fernando Minza	Ingeniero	SD	Logia 3 interventoría	Presencial
16	Edinson Bonilla	Ingeniero	SD	Logia 3 interventoría	Presencial
17	Alejandra Zambrano	Ingeniera	interventoriacapstunal@gmail.com	Logia 3 interventoría	Presencial
18	Alexander Lindarte	Director	Directortunal.2022@gmail.com	Consorcio Tunal 2022	Presencial
19	Carlos Tovar	Ingeniero	SD	Subred Sur – Gestión de proyectos	Presencial
20	Johan González	Profesional Control Social	JSGonzalez@saludcapital.gov.co	Secretaría Distrital de Salud	Presencial
20	Ana Milena Bayona Gómez	Profesional Universitario	participacion.tunjuelito@subredsur.gov.co	Of. Participación Comunitaria	Presencial

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALA L107 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5	

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

1. Bienvenida y registro de asistencia
 2. Seguimiento compromisos
 3. Presentación avances convenios El Tunal – recorrido a las obras Centro de Salud y Reorganización Urgencias
 4. Acuerdos y compromisos
- Cierre de la reunión

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

Se verifica asistencia de ciudadanía veedurías e invitados de asociaciones y COPACOS, ingenieros de contratista e interventoría de las obras Centro de Salud y Reorganización Urgencias, profesional de control social SDS, ingeniero apoyo a la supervisión Gestión de Proyectos y Profesional de Participación de la Subred Sur.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

- Socialización de cronograma de obras y ejecución financiera. Proyectada para la reunión de mayo
- Envío acta y presentaciones de la reunión. Se realizó envío del acta de la mesa de dialogo anterior el 27 de marzo a los correos electrónicos registrados.
- Recorrido de obras. Se realiza gestión logística de apoyo de transporte y preparación de ruta segura por parte de los contratistas de las obras, posibilitando el recorrido de 25 de abril.
- Seguimientos veedores. Se entregan por correo e imágenes por Whatsapp.
- Convocatoria reunión seguimiento de veedores. Se realiza recordatorio del recorrido por correo electrónico, por aplicación de Whatsapp y telefónico, según acuerdo de la sesión anterior.

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. Bienvenida y registro de asistencia
Se realiza mesa de dialogo presencial en la sede de Hospital El Tunal, siguiendo las indicaciones de uso de tapabocas y desinfección de manos, además de uso de indumentaria para seguridad de los veedores en el área de obra, según las recomendaciones de seguridad de contratista (calzado cerrado, pantalón grueso, chaqueta). La Oficina de Participación de la Subred Sur, gestionó el vehículo institucional para el traslado de los veedores desde puntos Potosí, Manuela Beltrán y Venecia, desde las 9:00 am.
Se da inicio a la reunión para el seguimiento de avances con el recorrido de los Convenios 2806257 de 2020 y 1223 de 2017 SDS – Subred Sur, siendo la 10:10 am con 07 veedores y 07 líderes comunitarios de formas de participación.
La bienvenida y apertura de la reunión la realiza la profesional de participación para Tunjuelito Ana Milena Bayona Gómez, dando contexto de las obras de Tunal y explicando el objetivo de la reunión y presentando los profesionales que acompañaran para ofrecer la información.

3. *Presentación avances convenios de obras El Tunal*

Se recuerda a los asistentes que se tienen dos proyectos de obra en desarrollo en la sede de El Tunal: y se iniciara en el Centro de Salud y luego al área de urgencias.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALA 100 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5


Recorrido a la obra de Centro Salud Tunal



Los ingenieros de interventoría de Logia 3 y UT MO 2021, saludan a los asistentes y agradece a los veedores la asistencia al recorrido por la obra del Centro de Salud El Tunal, informa que por motivos de seguridad los asistentes podrán ingresar al primer y segundo piso del edificio, se realizan recomendaciones para tener precaución con pisos, paredes y materiales en el área, puesto que aun pisos están en obra gris y no está a nivel, hay tubería y herramientas en el piso, hay áreas señaladas donde solo se podrá hacer observación, se realiza revisión de la indumentaria de calzado, pantalón y chaqueta de los veedores y se especifica que al no estar adelantándose trabajos de la obra, se considera que no es necesario el uso de cascos.

Acompañando el recorrido ofreciendo la información de los avances la ingeniera de la interventoría: el porcentaje de ejecución es del 66%. Continúan los trabajos de mampostería, enchapados, instalación de ventanales y paredes internas con superboard. También se especifica que se instalaron las cubiertas de diseño en las fachadas del piso cuarto y alrededor de las escaleras para usuarios.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALA 1507 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

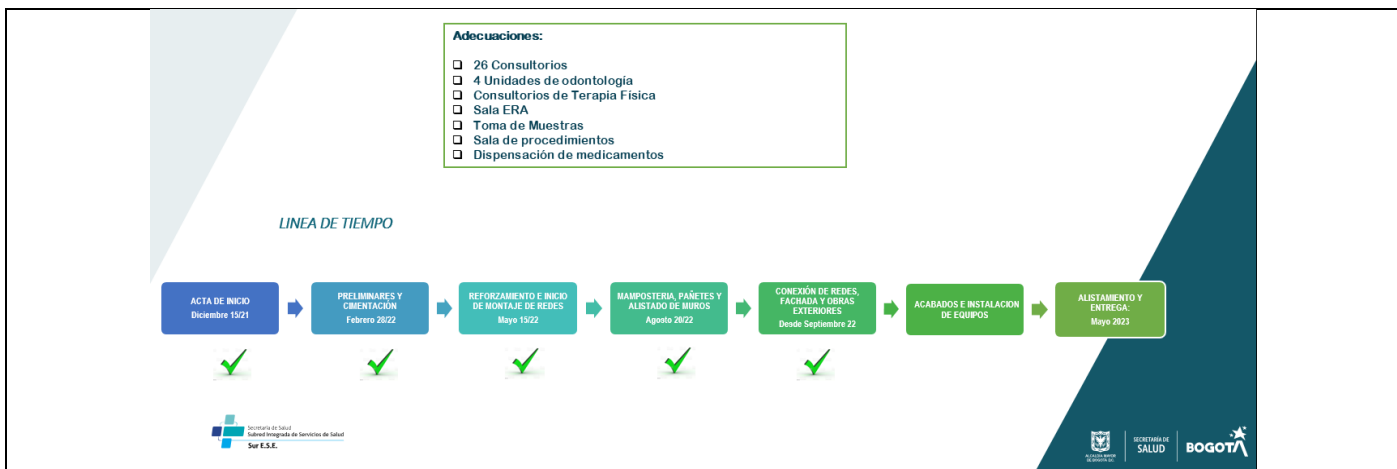

En el edificio se evidencian los avances instalación y pruebas de ascensores hasta el quinto piso, se presentó a los veedores el área de terapia física la cual tiene ya instaladas paredes de superboard además de enchapado de baño, se observa levantamiento de paredes en el área de farmacia y ventanilla, de recepción y sala de espera, área de auditorio, sala de juntas, indican que aun no están en uso las escaleras para usuarios, esta pendiente la instalación de barandales. También es visible el área donde quedará el control de redes y eléctricas, es evidente la instalación de cableado en todos los pisos. Aun no se han instalado los divisores y las unidades sanitarias.

En el segundo piso se evidenció la distribución de 8 consultorios médicos, los cuales cuentan con su respectivo baño, se pudo observar consultorios de procedimientos menores y consultas especiales. Además de explicar donde se ubicarían recepción, facturación y sala de espera para usuarios. Se observa en el área que está terminando la instalación de la red contra incendios específicamente las flautas o derivaciones para los rociadores. También se evidencia que se están haciendo las estructuras para instalación de cielos rasos.

La ingeniera informa que están pendientes en el próximo mes la carga de pisos lo cual se realizará a mediados de mayo, teniendo en cuenta que es de alto impacto, considerando que al ser delicado el proceso se explica que esa instalación se hace cuando ya no haya posibilidad de uso de equipos que puedan rayarlo. También se observa que se realizó la instalación de las escaleras de emergencias.

Con respecto a pisos 3ro y 4to, indica la ingeniera de interventoría que están realizando instalación de tuberías, levantando paredes perimetrales, y se están levantando las paredes de los consultorios y baños. Se da espacio para las intervenciones y preguntas de los veedores, siendo los temas centrales:

- Solicitan los veedores en próximo recorrido poder hacer verificación de avance en los pisos tercero y cuarto.
- Se hacen observaciones sobre la altura de techos en el primer piso, considerando algunos veedores que están muy bajos y podrían dañarse al ingreso de equipos nuevos. La interventora explica que la estructura antigua no permitía modificaciones de altura de los techos, sin embargo se está manejando un promedio de 2,20 m, lo cual está dentro de la norma técnica.
- Los veedores indican que es importante que las escaleras de emergencia queden protegidas, por seguridad de los bienes de la sede y también por posibles conductas de autoagresión de los ciudadanos.
- Se hacen observaciones los veedores frente a los colores que se le darán a las fachadas, indicando que no sea blanco, porque no tiene buen envejecimiento. La interventora indica que se tienen colores institucionales referidos por la secretaría distrital de salud, y la pintura tendrá que ser de calidad para

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALA 1.017 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5


fachadas, para limpieza y mantenimiento adecuado.

- Se realizan observaciones sobre la seguridad del cuarto piso, se pregunta por las condiciones para resistir temblores, se indica que el edificio cuenta con los estudios y diseños antisísmicos.
- Una veedora sugiere que se haga instalación de vidrios de seguridad en ventanillas, teniendo en cuenta la estatura de los usuarios, además de la gestión de instalación de altavoces, porque con el vidrio sin el sistema de sonido, sería muy difícil la comunicación de quienes estén en ventanillas y los usuarios.
- Los veedores preguntan sobre el cumplimiento de los tiempos, considerando que la Secretaría Distrital de Salud aprobó prórroga hasta el 30 de mayo. La interventora informa que el contratista tiene presente los tiempos y que se busca que no se tengan más atrasos en los tiempos y cumplir con la fecha de 30 de mayo.
- Se vienen adelantando los trabajos de mampostería, pañetes y alistamiento de muros, instalación de redes electrónicas y eléctricas y enchape de baños en los cuatro pisos y está pendiente la instalación de unidades sanitarias y divisiones de baños.
- Se explica que el edificio no cuenta con sistema para recolección de aguas lluvias para aprovechamiento, dada la estructura antigua.
- Los veedores preguntan sobre los trabajadores de la obra, explica la interventora que se han realizado cambios de perfil en esta etapa de la obra, trabajando con un promedio de 30 personas de diferentes perfiles.



Se realiza recorrido en el segundo frente de obra reorganización en la que se ubicaba antiguamente urgencias y consulta externa, siendo recibidos por el ingeniero director de la obra del consorcio Tunal 2022, quien facilita para cada veedor y ciudadanía cascos, indicando que es de obligatorio uso, teniendo en cuenta el riesgo en la etapa de escavacion, ante lo cual una veedora manifiesta no querer usar el casco por lo cual se retira del recorrido:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 1988-1991 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

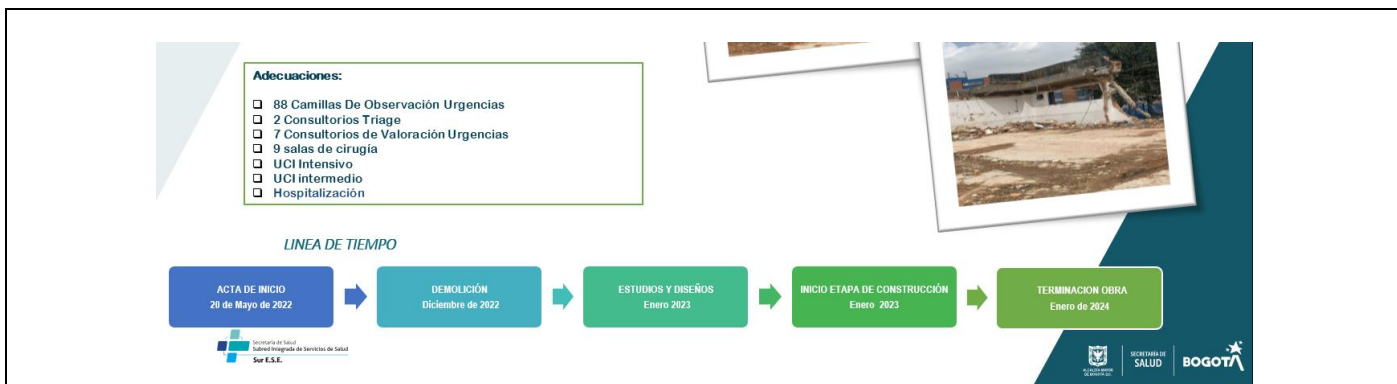

El arquitecto del consorcio informa que se tiene un avance de obra del 6 %, actualmente continúan las actividades de excavación, se tiene proyectado reforzamiento de estructura en antigua área de gestión de conocimiento.

También el ingeniero manifiesta que durante la excavación, se encontró la circulación de aguas subterráneas y al hacer las respectivas verificaciones se evidenció que tienen que ver con aguas de lluvias, por lo cual se definió hacer unos pozos de retención de esas aguas, buscando no tener afectaciones en las tareas de excavación, indicando que una vez se hagan las cimentaciones, se construirá teniendo en cuenta esas aguas dejándolas debajo de la estructura. Se muestra a los veedores la huella de la excavación, que es mas evidente, dando una dimension de la estructura que se construirá. Indica el ingeniero que se esta tramitando el ingreso de la maquinaria de piloteadora. Estan trabajando en el momento con 17 personas que realizan trabajo pesado, cuentan con maquinaria pesada para este proceso y se indica que estan contratadas 10 volquetas que estan entrando y saliendo para recolección de escombros según indicaciones aprobadas en plan de manejo de tráfico. Tambien informa que con el permiso ambiental se hizo tala de arboles y se pudo hacer traslado de dos de ellos.

Los veedores hacen diferentes preguntas e intervenciones con respecto a:

- Que se hizo con los arboles podados, indican que el material de poda de arboles fue recogido directamente según los procedimientos por secretaria de ambiente.

- Se solicita información sobre profundidad de la obra y riesgos por afectación de las aguas subterráneas. El ingeniero indica que ya se hicieron las simulaciones y calculos, estableciendo el plan de manejo para que no haya afectación o riesgo con la obra.

- Preguntan sobre cronograma de la obra, para confirmar si se estan cumpliendo los tiempos.

El ingeniero responde las inquietudes de los ciudadanos y se hace cierre de la actividad, con recorrido en el perimetro del area de la obra.

El profesional de control social realiza recomendaciones y sugerencias en el manejo de la información con respecto a las obras de infraestructura en salud, teniendo en cuenta el inicio de etapa electoral en la ciudad.

Acuerdos y compromisos

- Enviar acta de recorrido a los correos electrónicos reportados, para soportar la mesa de dialogo.
- Se realizará recorrido a centro de salud Tunal en mayo, dada la próxima entrega de la obra, fecha por convenir.
- Próximo recorrido según las recomendaciones de seguridad en la obra de reorganización urgencias, la cual se proyecta para el sábado 17 de junio.
- Se realizará mesa de dialogo virtual para el martes 18 de mayo de 2023.
- Los veedores comparten las recomendaciones y compromisos registrados en sus formatos de seguimientos.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 1946-1957 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

7. COMPROMISOS:			
QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite aaaa-mm--dd)	QUIEN (Responsable)
Envío acta reunión	Envío por correo electrónico	25 abril 2023	Ingeniero y Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Recorrido a las obras	- En mayo se proyecta nuevo recorrido a la obra de centro de salud Tunal, dada la próxima entrega - En junio se proyecta recorrido a la obra de reorganización urgencias	Mayo por definir Junio 17 - 2023	Ingeniero y Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Mesa de dialogo	Reunión virtual	18 mayo 2023	Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano Subred Sur Veedores
Seguimiento a recomendaciones	- Protección de escaleras de emergencia - Vidrios y sonido en área de ventanillas	18 mayo 2023	Ingeniero y Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

CARLOS TOVAR,

MATEO ARISTIZABAL Y

MARIA ELENA RESTREPO

SECRETARIO REUNIÓN

ANA MILENA BAYONA GÓMEZ





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALA DE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD SUR E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V5

FECHA: 15-04-2023		HORA DE INICIO: 9 am HORA TERMINACIÓN: 12:30 pm		TEMA PRINCIPAL DE LA REUNIÓN:		Mesa de trabajo		ESPACIO COMUNITARIO:		Veeduría Obras Tonal	
N°	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	NÚMERO TELEFONO Fijo	NÚMERO CELULAR	CORREO	PRIMA			
1	Ana Milena Bayona Gomez	58300295	Subred Sur OF PC y SC	Tunelito	—	311 8195309	participacion.salud@tonal.gov.co	—	—	—	—
2	Berny Ortiz	41722448	ASOCH Tonal	Tunelito	3003378	—	—	—	—	—	—
3	Jose Garcia Hernandez	19065521	ASOCH Tonal	Tunelito	3003378	—	—	—	—	—	—
4	Cecilia Suarez	41443148	ASOCH Tonal	Tunelito	3003378	—	—	—	—	—	—
5	Ricardo Perez	35488174	ASOCH Tonal	Tunelito	3003378	—	—	—	—	—	—
6	Ana Alca Diaz	41722448	ASOCH Tonal	Tunelito	3003378	—	—	—	—	—	—
7	Berta Longo	41378330	ASOCH Tonal	Tunelito	3003378	—	—	—	—	—	—
8	Daniel Suarez	17133349	ASOCH Tonal	Tunelito	3003378	—	—	—	—	—	—
9	Ana Simoes	29289161	ASOCH Tonal	Tunelito	3003378	—	—	—	—	—	—
10	Alfonso Mejia	23275091	ASOCH Tonal	Tunelito	3003378	—	—	—	—	—	—
11	Nelly Salazar	21551479	Veeduría	Tunelito	3003378	—	—	—	—	—	—

2



FECHA:		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E				PS-PAR-FT-05 V2			
15-04-2023		LISTA ASISTENCIA REUNIÓN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD							
N°	NOMBRE Y APELLIDO	HORA DE INICIO: HORA TERMINACIÓN: 12:30 pm	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNIÓN: ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	NÚMERO TELÉFONO FIJO	ESPACIO COMUNITARIO: NÚMERO CELULAR	CORREO	FIRMA
1	Pineda Gaitan	20563713	20563713	CEPAC Vendo 12a	CB 12	3123456789	3123456789	--	Vendia Otras. Tunal
2	Calderon	1069053521	1069053521	Salud SW	--	32027728	32027728	--	32
3	Pineda Maza	910721	910721	Interventoria	--	31087870	31087870	--	33
4	Edinson Bonilla	483900853	483900853	Interventoria	--	38216521	38216521	--	34
5	Alexander Lindarte	1093370068	1093370068	Director para Censos 2022	--	3168747610	3168747610	--	35
17									
18									
19									
20									
21									
22									



CA-FT-02 V5

FECHA		HORA DE INICIO	HORA DE TERMINACIÓN	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNIÓN	LOCALIDAD	NUMERO TELEFONO Fijo	ESPAÇO COMUNITARIO	VEEDURIA OTRAS
1504-2023	12:30 PM	9 am	12:30 PM	Mesa de dialogo - Recuerdo				
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	NUMERO TELEFONO Fijo	ESPAÇO COMUNITARIO	VEEDURIA OTRAS	
13	Mr. Juan Carlos	111139	Organización Comunitaria	6 de	320361			
14	Alejandro Zambrano	52702410	Organización Comunitaria	8	31267554			
15	Donato Bland	79719893	Organización Comunitaria					
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALA L107
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S. E

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V5



Registro fotográfico recorrido a obras de Centro de Salud Tunal – Abril 15 de 2023



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALA L107
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S. E

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V5



Registro fotográfico recorrido a Obras de Reorganización Urgencias – Abril 15 de 2023
