

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred integrada de servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	MI-SIG-SIG-FT-01 V4

NOMBRE DE LA REUNIÓN: Reunión Veedores – Seguimiento al Convenio 1223 de 2017 CAPS Tunal y al Convenio 2806257 de 2021 Urgencias- Reordenamiento USS Tunal– SDS Subred Sur		
RESPONSABLE: María Elena Restrepo García	SECRETARIO: Notas x: Ana Milena Bayona Gómez	
REUNIÓN N°: 02 – 2023	FECHA: 22 marzo 2023	HORA INICIO: 10:00 am
LUGAR: Oficina de Participación de El Carmen - Herramienta para el encuentro y la deliberación MEET		HORA FINAL: 12:00 m

1. OBJETIVO:
Realizar asistencia técnica en reunión de seguimiento de veeduría al Convenio 2806257 de 2021 de adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal y Convenio 1223 de adecuación y dotación CAPS El Tunal – Fondo Financiero Distrital y Subred Sur. Se siguen las directrices de bioseguridad de lavado de manos y uso de tapabocas.

2. PARTICIPANTES:

Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de "Listado de asistencia DI-DE-FT-07"

NOMBRE		CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	Rosalba Gutiérrez	Veedora	asodeuhvh3@gmail.com	Veeduría obras El Tunal	Herramienta MEET
2	Edgar Loaiza	Veedor	libraescorpion1941@gmail.com	Veeduría obras El Tunal	Herramienta MEET
4	Nelly Saldarriaga	Veedora	nellya@hotmail.com	Veeduría obras El Tunal	Herramienta MEET
5	Elizabeth Rivera	Veedora	asodeuhvh3@gmail.com	Veeduría obras El Tunal	Herramienta MEET
6	Luis Carlos Quitian García	Veedor	luisquitian@gmail.com	Veeduría obras El Tunal	Herramienta MEET
7	Mateo Aristizabal	Ingeniero	Mateoaristizabal.subredsur@gmail.com	Subred Sur – Gestión de proyectos	Herramienta MEET
8	Carlos Tovar	Ingeniero	Sin dato	Subred Sur – Gestión de proyectos	Herramienta MEET
9	María Elena Restrepo García	Médico Especialista proyectos	Mariaelena2219@hotmail.com	Subred Sur – Gestión de proyectos	Herramienta MEET
10	Johann Sebastián González	Referente Control social	JSGonzalez@saludcapital.gov.co	Dir. Participación SDS	Herramienta MEET
11	Ana Milena Bayona Gómez	Profesional Universitario	participacion.tunjuelito@subredsur.gov.co	Of. PC y SC – Subred Sur	Herramienta MEET

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	MI-SIG-SIG-FT-01 V4

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

1. Bienvenida y registro de asistencia
2. Seguimiento compromisos
3. Presentación avances convenios El Tunal
4. Acuerdos y compromisos
5. Cierre de la reunión

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

Se verifica asistencia de ciudadanía, profesionales de gestión de proyectos, profesional de la oficina de participación de la Subred Sur y profesional de control social de SDS

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

1. Copia de prorroga y adición en obra Centro de Salud Tunal. Se envía a correo electrónico de los veedores.
2. Socialización manejo de reciclaje en la obra por parte de la Subred Sur. El ingeniero Mateo Aristizabal, informa que la Subred Sur tiene como procedimiento, que los materiales aprovechables previos al inicio de las obras son recolectados por la dirección administrativa y se usan en los trabajos de mantenimiento en diferentes sedes. Cuando inicia la obra y se hacen demoliciones los materiales recolectados son recogidos según cronograma por parte de la dirección administrativa y es vendido, recurso se usa en rublo de mantenimiento.
3. Envío acta reunión. Se envió el acta por correo electrónico el 13 de febrero, a los correos registrados por los veedores.
4. Seguimientos veedores. Se hicieron llegar por imagen Whatsapp.
5. Mesa de dialogo. Programada para el 16 de marzo, pero se cruzó con una reunión con representante a junta directiva, por lo cual se realiza el 22 de marzo.
6. Recorrido obras Tunal. Se proyecta para el sábado 15 de abril.

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. Bienvenida y registro de asistencia

Se realiza reunión virtual usando herramienta MEET, se da inicio a la reunión para el seguimiento de avances de los Convenios 2806257 de 2020 y 1223 de 2017 SDS – Subred Sur, siendo las 10:10 am iniciando la reunión con 03 veedores y en el transcurso se completa la participación de 05 ciudadanos.

La bienvenida y apertura de la reunión la realiza la profesional de participación para Tunjuelito Ana Milena Bayona Gómez, dando contexto general del objetivo de la mesa de dialogo de las obras de Tunal.

3. Presentación avances convenios de obras El Tunal


La médico especialista María Elena Restrepo, los ingenieros Mateo Aristizabal y Carlos Tovar, saludan a los asistentes y agradecen la participación, explicando que realizaran presentación de los avances de dos proyectos que se están adelantando en el predio de Tunal:



Se inicia la presentación de avances de la obra de Centro de Salud Tunal

1

Proyecto:
Adecuación y Dotación Centro de Salud El Tunal

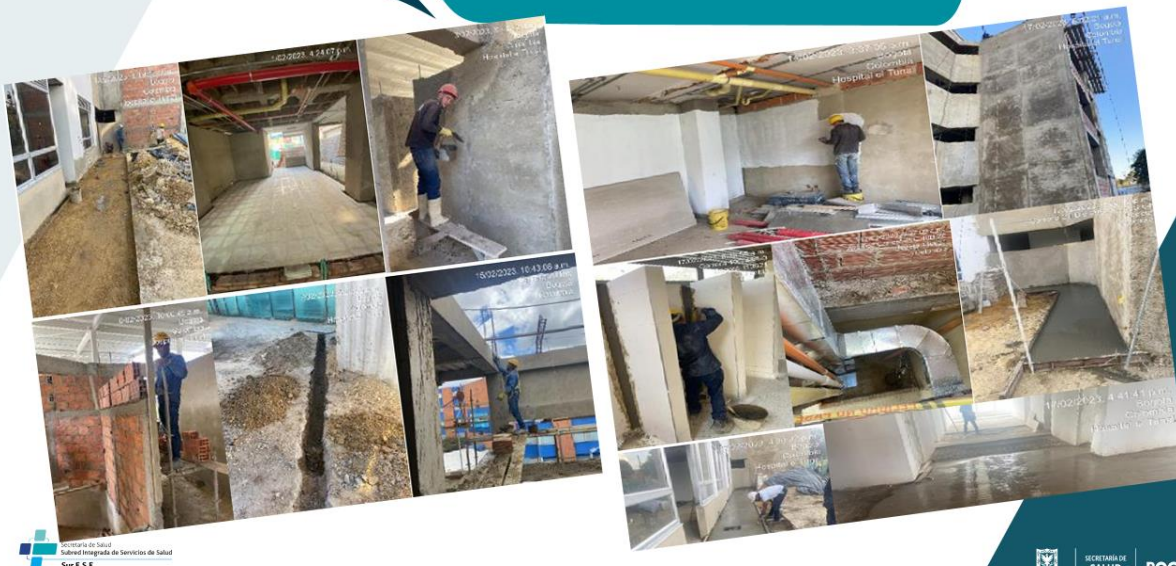

PROYECTO ADECUACIÓN Y DOTACIÓN CENTRO DE SALUD EL TUNAL



Población a Beneficiar 53.300 Personas

% Avance obra con corte 28 de febrero 2023

- EJECUTADO: 63.90%
- PROGRAMADO: 66.59%

Dotación Biomédica

- Mes de febrero de 2023, la EGAT publicó en la plataforma SECOP II, el informe No. 4, obteniendo con este ejercicio el listado final de proponentes habilitados,
- el 17 de febrero de 2023 mediante correo electrónico la EGAT remitió a la Subred Sur, la recomendación de adjudicación.

Dotación Mobiliario

- En el mes de febrero 2023 se realizó adjudicación de subasta inversa y se entrega acta de recomendación por parte de la EGAT a la Subred Sur

El ingeniero Mateo Aristizabal, informa que se inicia en el cuarto pisos la instalacion de las paredes internas de superboard, lo mismo que con ayuda de gruas se están instalando las escaleras de emergencia y las protecciones perimetrales metalicas, se estan ademas instalando pisos de primer y segundo piso.



Se realiza socialización de avances en la obra de urgencias

2

Proyecto:

Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal



PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL



Población a Beneficiar 459.554 Personas

% Avance obra con corte 28 de febrero 2023

- **EJECUTADO: 5,20%**
- **PROGRAMADO: 6,11%**

- **Actividades ejecutadas en OBRA**
- Durante el periodo evaluado se continuó adelantando la ejecución de la demolición del antiguo edificio de consulta externa.
- Durante el mes de febrero 2023, el Programa Médico Arquitectónico – PMA, continuó en ajuste, de acuerdo con los diseños arquitectónicos definitivos, se estableció el PMA a nivel de anteproyecto, está pendiente el PMA a nivel proyecto.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	MI-SIG-SIG-FT-01 V4

Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la USS El Tunal

Dotación Biomédica:

- En el mes de febrero 2023, se realizaron mesas de trabajo virtuales con profesionales del Consorcio, en las cuales se verificaron las fichas técnicas de la dotación biomédica.
- Se realizaron mesas de trabajo con profesionales de red de gases (contratistas), para tener la claridad respecto a las necesidades a futuro de los equipos biomédicos que utilizan estos elementos para su funcionamiento.
- Se realizaron mesas de trabajo con profesionales de TIC para tener la claridad en las necesidades a futuro de los equipos biomédicos que utilizan estos elementos para su funcionamiento.
- **Dotación Mobiliario:** Con respecto al mobiliario en el mes de febrero 2023, se realizaron mesas de trabajo con la Interventoría de obra, para verificación del mobiliario correspondiente.



Los ingenieros Mateo Aristizabal y Carlos Tovar, informan que se están haciendo unas diligencias administrativas para ingreso de maquinaria plataforma para pilotaje. También se viene haciendo estudio de una corriente de agua encontrada en el área de la excavación y que no corresponde a tubería, lo cual requiere de revisiones técnicas para hacer el correcto manejo de la situación. Informan los ingenieros que se hizo el retiro y replantación de árboles que estaban en la zona de la obra.

Se abre espacio de preguntas e intervenciones de los veedores, centrando las intervenciones en los temas:

- Algunos de los veedores asistieron a recorrido al Centro de Salud Candelaria la Nueva, y encontraron que el nuevo edificio no cuenta aún con la conexión eléctrica directa por parte de ENEL CODENSA, lo cual ha retrasado la puesta en marcha de ascensores y algunos equipos y genera inestabilidad en el funcionamiento de computadores y sistemas, los veedores preguntan si en las obras de Tunal podría presentarse el mismo problema, especialmente en el centro de salud, teniendo en cuenta que es una obra de adecuación. Los ingenieros manifiestan que proyectan que no se presente la dificultad, toda vez que es un edificio que ya cuenta con la conexión autorizada de ENEL CODENSA, solo se haría una certificación de la conexión.
- Los veedores Edgar Loaiza y Luis Carlos Quitian, informan que fueron convocados al recorrido programado por la Alcaldía Mayor para verificación de las obras y en este evidenciaron gran avance en la excavación en el área de urgencias, además de poder hacer revisión de los planos de la obra, considerando que se va por buen camino.
- Ante inquietudes de los veedores frente al porcentaje de ejecución de las obras, se propone que en próxima reunión se presente por parte del arquitecto o ingeniero el cronograma y los

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred integrada de servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	MI-SIG-SIG-FT-01 V4

porcentajes, lo mismo que reinducción en los convenios, enviando la información resumen.

5. Acuerdos y compromisos

- Enviar acta y presentación de la mesa de dialogo.
- Programar recorrido a las obras el sábado 15 de abril, por votación de los veedores se acuerda que se realice a las 10 am, solicitando la presencia de representantes de las empresas contratistas, gestionando vehículo institucional desde la oficina de participación comunitaria, que iniciaría el recorrido para recogerlos desde las 9 am.
- Socialización de cronograma y sus porcentajes de ejecución de las obras.
- Los veedores enviaran copia de los seguimientos.

6. Cierre reunión

Cierra la reunión siendo las 11:30 am. Se proyecta próxima mesa de diálogo para el recorrido de las obras para el 15 de abril a las 10:00 am

Se adjuntan lista de asistencia de registro google y registro fotográfico.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred integrada de servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	MI-SIG-SIG-FT-01 V4

7. COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite dd-mm-aa)	QUIEN (Responsable)
Socialización de cronograma de obras y ejecución financiera	En mesa de dialogo	15 abril 2023	Médico Especializado e ingenieros de Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Envío acta y presentaciones de reunión	Envío por correo electrónico	30 marzo 2023	Médico Especializado e ingenieros de Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Recorrido de obras	Gestión de vehículo institucional Convocatoria a recorrido realizará recordatorio telefónicamente y por aplicación Whatsapp Subred Sur	15 de abril 2023	Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano Subred Sur Veedores
Seguimientos veedores	Envío por correo electrónico o aplicación Whatsapp	30 marzo 2023	Veedores
Convocatoria reunión seguimiento de veedores	Socialización de avances del desarrollo de los convenios. Gestión de vehículo para traslado de veedores Se realizará recordatorio telefónicamente y por aplicación whatsapp Subred Sur	14 abril 2023	Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano Subred Sur Veedores

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

MARIA ELENA RESTREPO

SECRETARIO REUNIÓN

ANA MILENA BAYONA GÓMEZ





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred integrada de servicios
de Salud Sur E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

MI-SIG-SIG-FT-01 V4

Veedores Tunal PS-PAR-FT-05 V2 LISTA ASISTENCIA REUNIÓN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD marzo 22 2023 (respuestas)

Marca temporal	Dirección de correo electrónico	NOMBRE Y APELLIDO	NUMERO DOCUMENTO (SIN PUNTOS Y SIN COMAS) *	NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD DE RESIDENCIA	TELEFONO DE CONTACTO	FIRMA
2023-03-22	asovhermosa@gmail.com	Rosalba Gutierrez	20263713	VEEDURIA ADECUACIÓN CAPS Y URGENCIAS EL TUNAL	CIUDAD BOLIVAR	312 5800058	CELULAR
2023-03-22	neliya@hotmail.es	Nelly Saldarriaga	21551479	VEEDURIA ADECUACIÓN CAPS Y URGENCIAS EL TUNAL	CIUDAD BOLIVAR	3212979245	CELULAR
2023-03-22	eliriga78@gmail.com	ELIZABETH RIVERA GALEANO	41707595	VEEDURIA ADECUACIÓN CAPS Y URGENCIAS EL TUNAL	CIUDAD BOLIVAR	3005787094	COMPUTADOR
2023-03-22	libraescorpion1941@gmail.com	Edgar Loaiza Alzate	17052759	VEEDURIA ADECUACIÓN CAPS Y URGENCIAS EL TUNAL	TUNJUELITO	3138078184	COMPUTADOR
2023-03-22	Luisquitian@gmail.com	LUIS CARLOS QUITIAN GARCIA	79825111	VEEDURIA ADECUACIÓN CAPS Y URGENCIAS EL TUNAL	RAFAEL URIBE URIBE	3125312525	COMPUTADOR
2023-03-22	participacion.tunjuelito@subredsur.gov.co	Ana Milena Bayona Gómez	52200295	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	OTRA	3118193509	COMPUTADOR
2023-03-22	mariaelena2219@hotmail.com	MARIA ELENA RESTREPO GARCIA	43049905	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	TUNJUELITO	3166182300	CELULAR
2023-03-22	mateoaristizabal.subredsur@gmail.com	Mateo Aristizabal	SD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	SD	311 2476802	CELULAR
2023-03-22	carlostovar.subredsur@gmail.com	Carlos Tovar	SD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	SD	SD	CELULAR
2023-03-22	JSGONZALEZ@SALUDCAPITAL.GOV.CO	JohannSebastián González Villarraga	1030535748	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	KENNEDY	3112629638	COMPUTADOR

